

REPORT QUINDICINALE N. 101

Periodo di riferimento: 01 Giugno 2015 – 15 Giugno 2015



INDICE REPORT

1. DATI GENERALI	3
2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE	4
3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE.....	5
3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno.....	5
3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato	6
4. SEZIONE CANTIERI	7
4.1. Elenco cantieri fissi	7
4.1.1. CANTIERE STAZIONE	8
4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE	9
4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO	10
4.1.4. CANTIERE FORTEZZA	11
4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE.....	12
4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'	16
4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI	18
4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE	19
4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI	20

1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA VELOCITA' DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell'Affidamento a Contraente Generale).


COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall'Associazione Temporanea di Imprese COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.


- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE	10/03/2010
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE	13/10/2010
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale):	27/08/2015
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):	15/11/2016

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

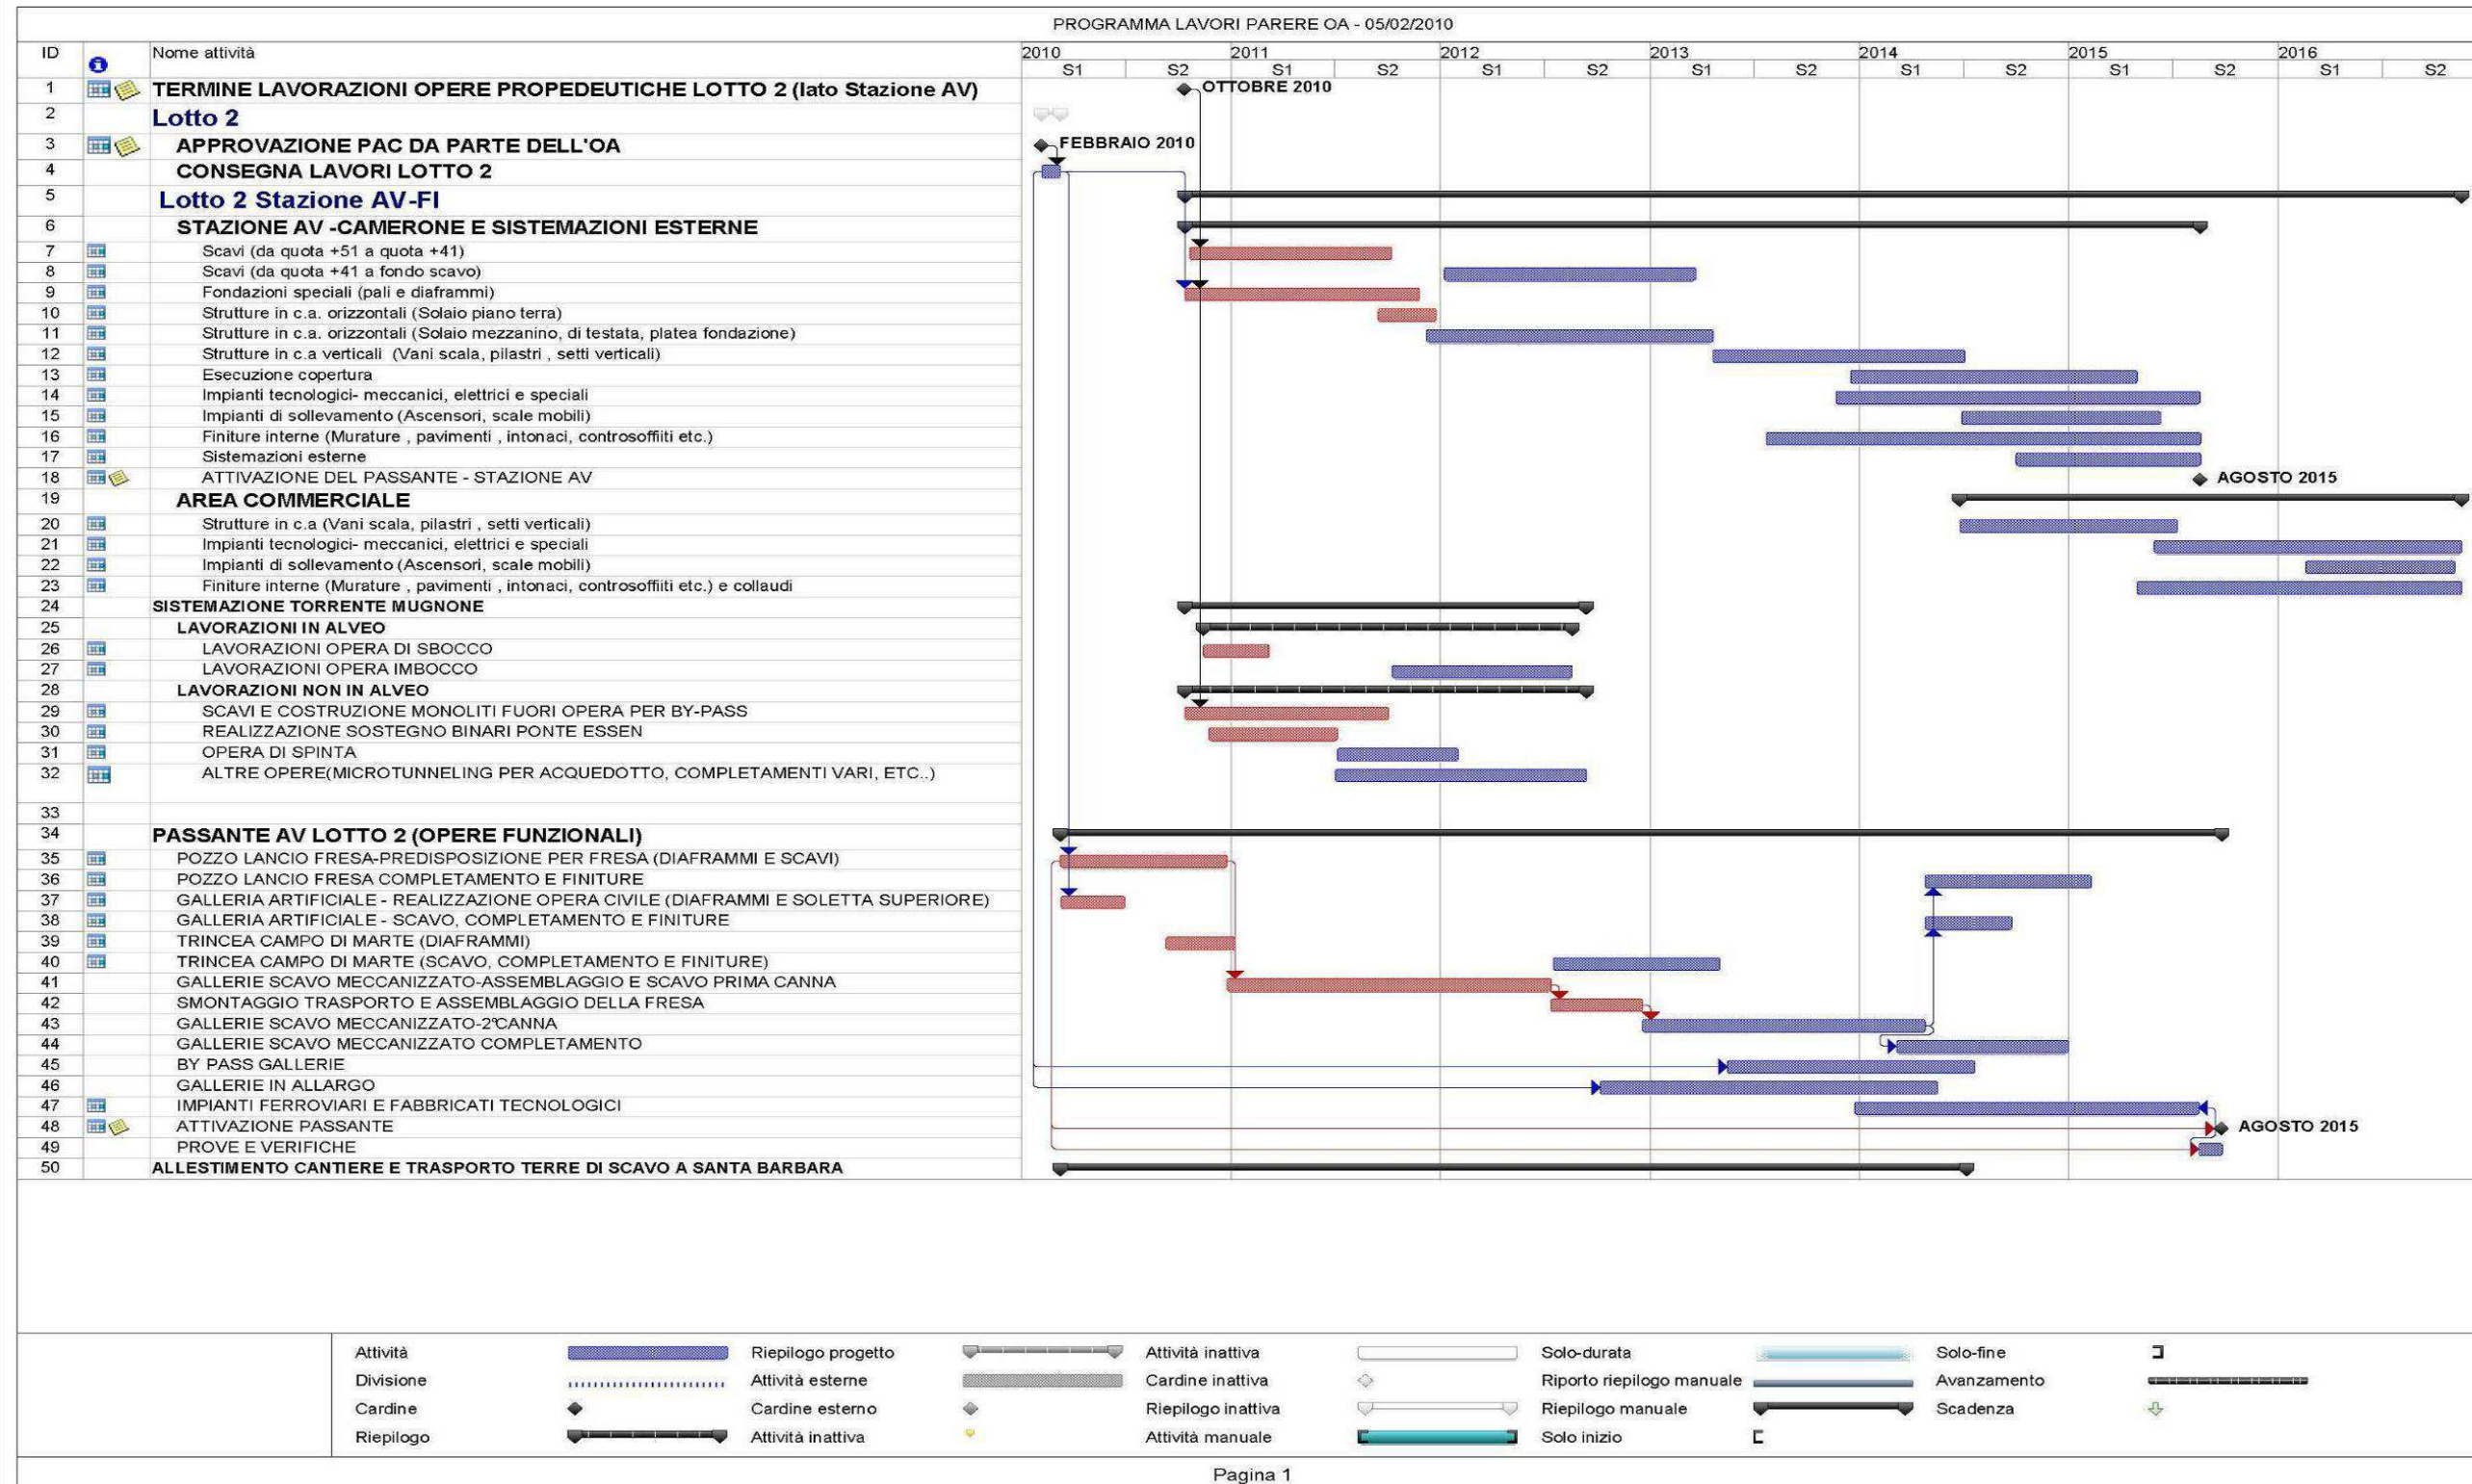

3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

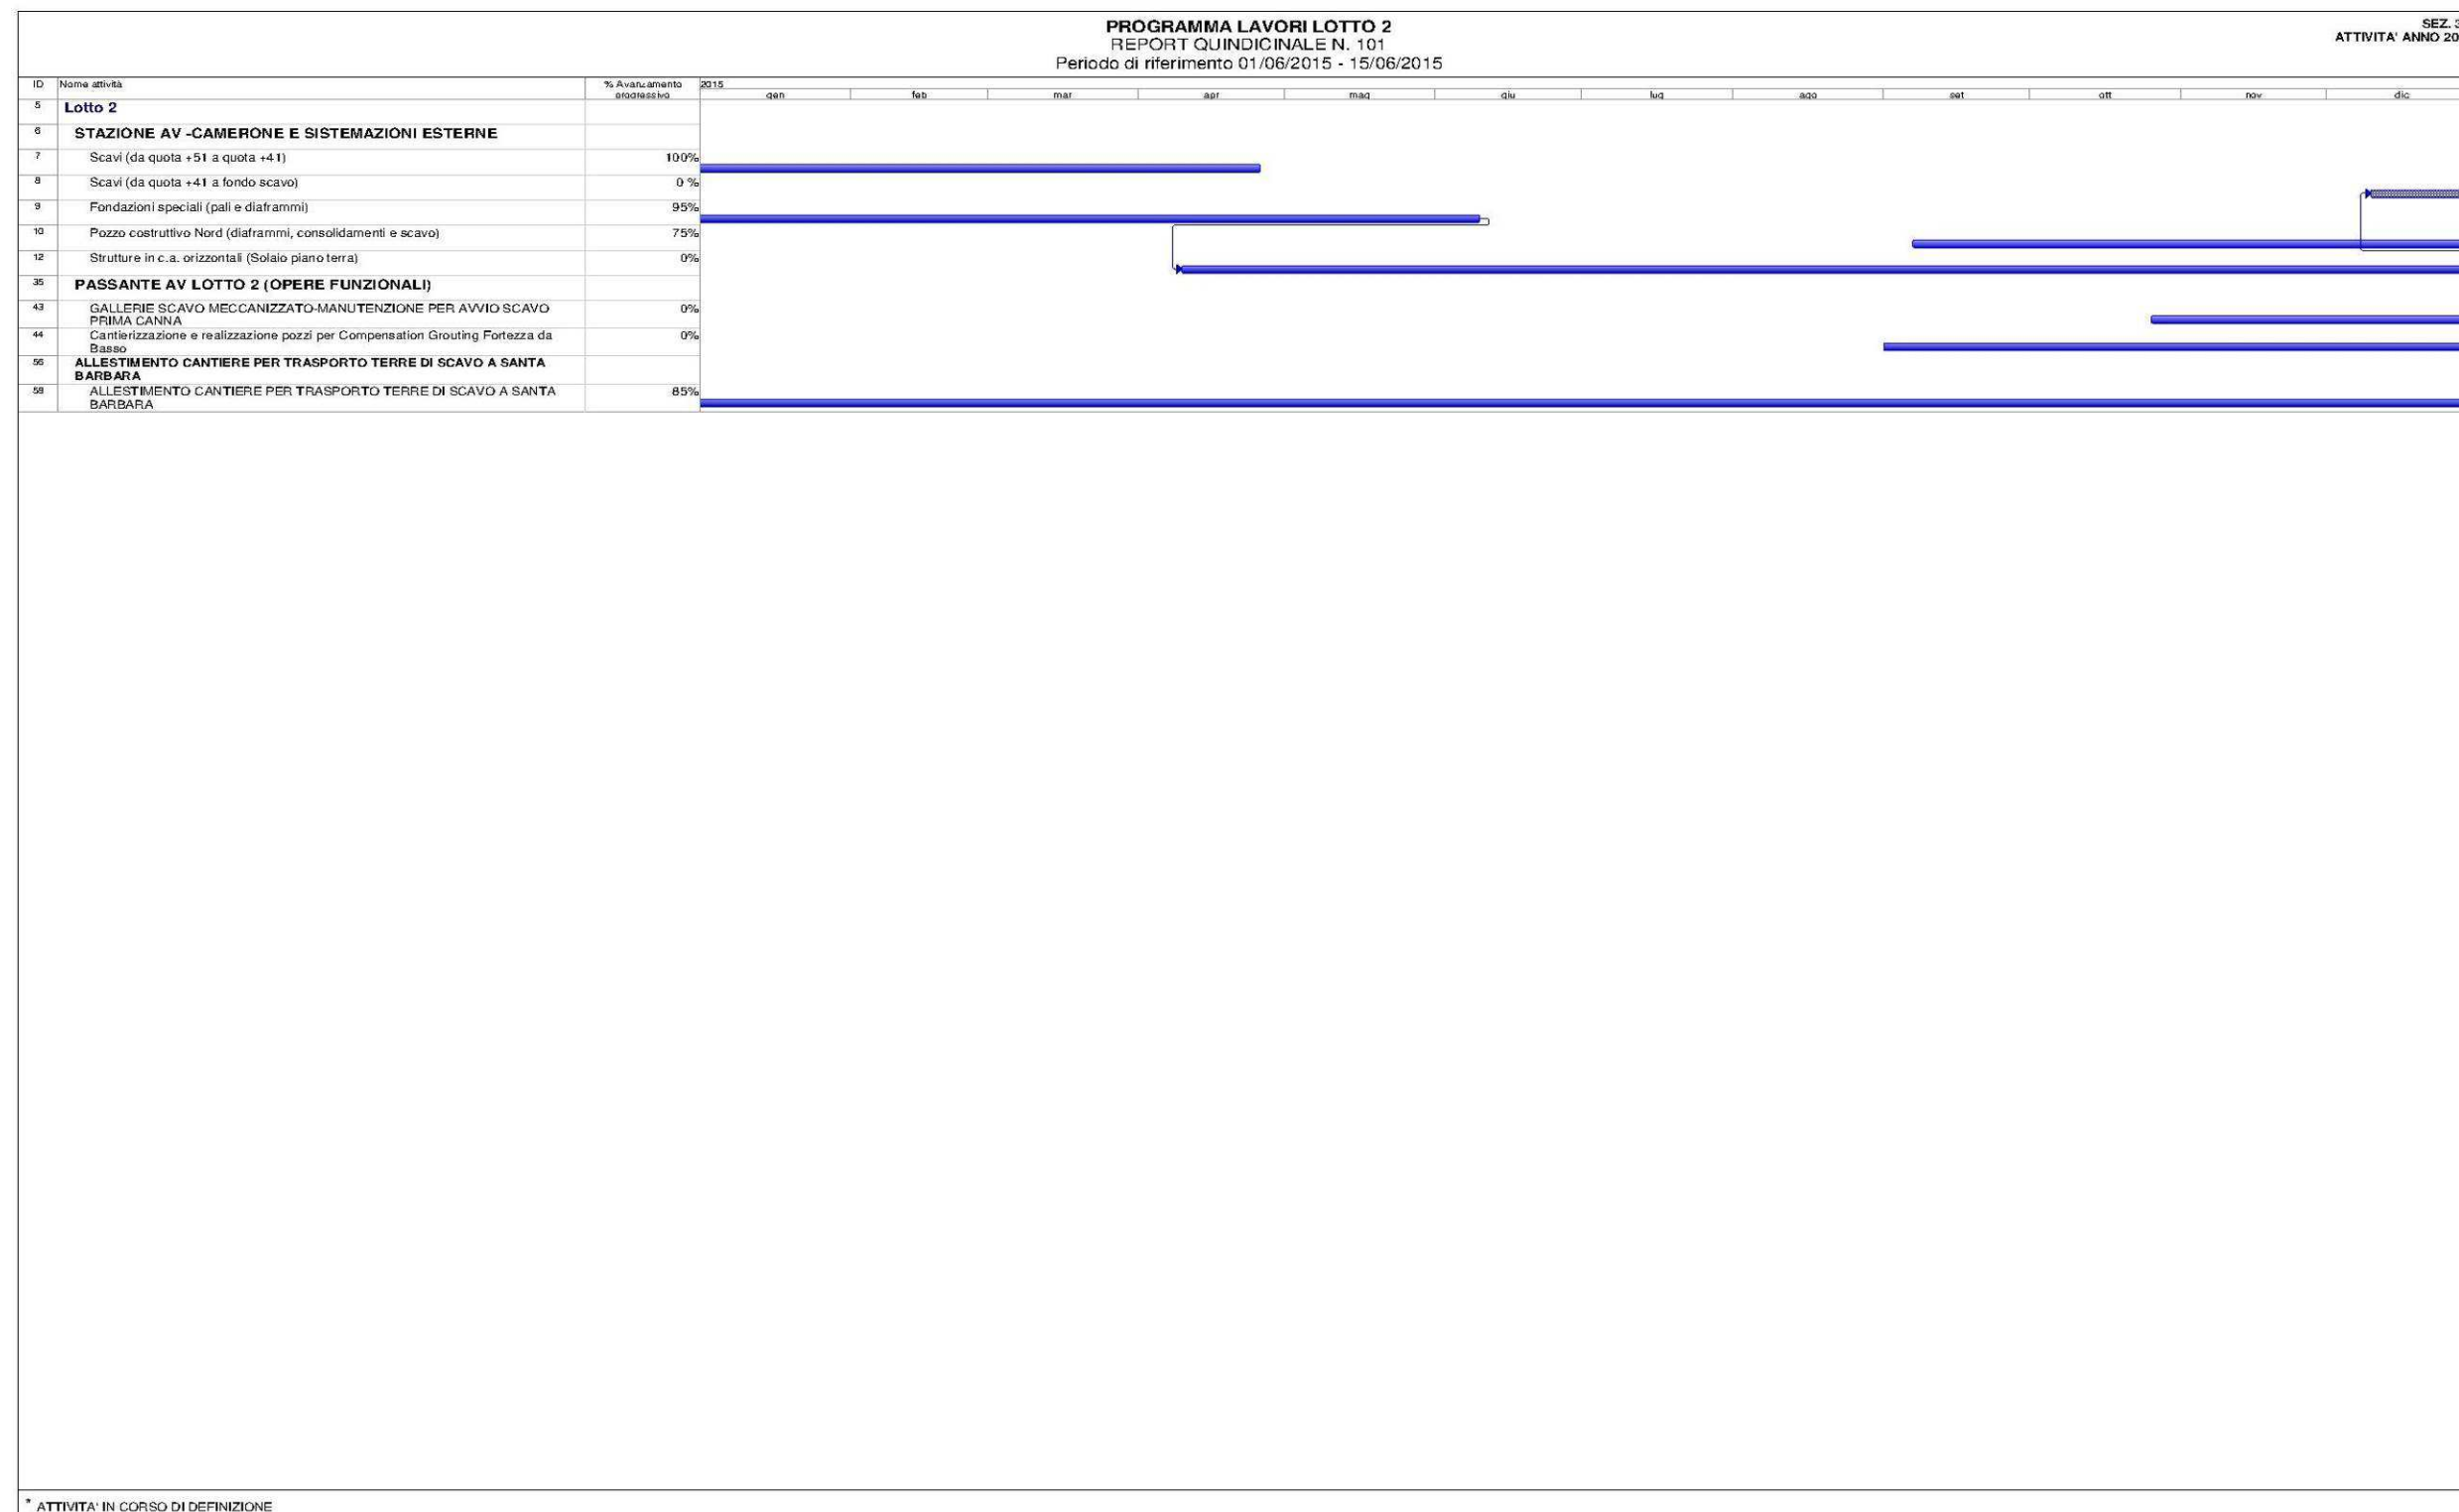

3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato

4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

- **CANTIERE STAZIONE**
- **BY PASS MUGNONE**
- **CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO**
- **AREA FORTEZZA**

4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.1.1

REPORT QUINDICINALE N. 101

Periodo di riferimento: 01 Giu 2015 - 15 Giu 2015

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - MAGGIO 2015	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
SCAVI (da quota +51 a quota +41)	21/11/2011	25/04/2015	1251	100%														Attività ripianificata a seguito di richieste Arpat
SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)																		
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi)	13/10/2010	09/06/2015	1701	95%														
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano terra)	10/04/2015	07/02/2016	304															
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)																		
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala, pilastri, setti verticali)																		
ESECUZIONE COPERTURA																		
IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI																		
FINITURE INTERNE (Murature, pavimenti, intonaci, controsoffitti etc.)																		
POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi, consolidamenti e scavo)	09/08/2010	30/10/2015	1909	75%														

■ ATTIVITA' REALIZZATA

■ ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

CANTIERE BY PASS MUGNONE

SEZ. 4.1.2

REPORT QUINDICINALE N. 101

Periodo di riferimento: 01 Giu 2015 – 15 Giu 2015

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - MAGGIO 2015	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
<u>LAVORAZIONI IN ALVEO</u>																		Attività in corso di definizione
LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO																		Attività in corso di definizione
LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO																		Attività in corso di definizione
<u>LAVORAZIONI NON IN ALVEO</u>																		Attività in corso di definizione
SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS																		Attività in corso di definizione
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN																		Attività in corso di definizione
OPERA DI SPINTA																		Attività in corso di definizione
ALTRE OPERE (MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)																		Attività in corso di definizione

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO

SEZ. 4.1.3

REPORT QUINDICINALE N. 101

Periodo di riferimento: 01 Giu 2015 – 15 Giu 2015

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - MAGGIO 2015	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
ASSEMBLAGGIO FRESA	03/03/2012	15/06/2012	104															E' in corso lo smontaggio; previsione montaggio nuova fresa ago-2015
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON ATTRAVERSAMENTO A PIENO)																		Attività in corso di definizione
MANUTENZIONE FRESA																		
SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE																		
SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)																		
MANUTENZIONE FRESA																		
ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE																		
SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA																		

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA

SEZ. 4.1.4

REPORT QUINDICINALE N. 101

Periodo di riferimento: 01 Giu 2015 - 15 Giu 2015

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - MAGGIO 2015	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
<i>CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE RASTRIGLIA - FASE A</i>																		Attività in corso di programmazione
POZZI COMPENSATION N.3-4																		
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (TAM)																		
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI																		
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI																		
<i>CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE CAVANIGLIA - FASE A</i>																		Attività in corso di programmazione
POZZI COMPENSATION N.1-2																		
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE																		
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI																		
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI																		

 ATTIVITA' REALIZZATA
 ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

- Proseguono le attività di realizzazione dei pali di fondazione del camerone della Stazione AV (Foto 1);
- Realizzazione della prima parete della rampa Kiss&Ride (Foto 2);
- E' iniziata l'attività di prolungamento delle colonne per l'Appoggio del Solaio Piano Terra (Foto 3).



FOTO 1– Realizzazione pali di fondazione camerone Stazione AV



FOTO 2– Realizzazione della prima parete della Rampa Kiss&Ride

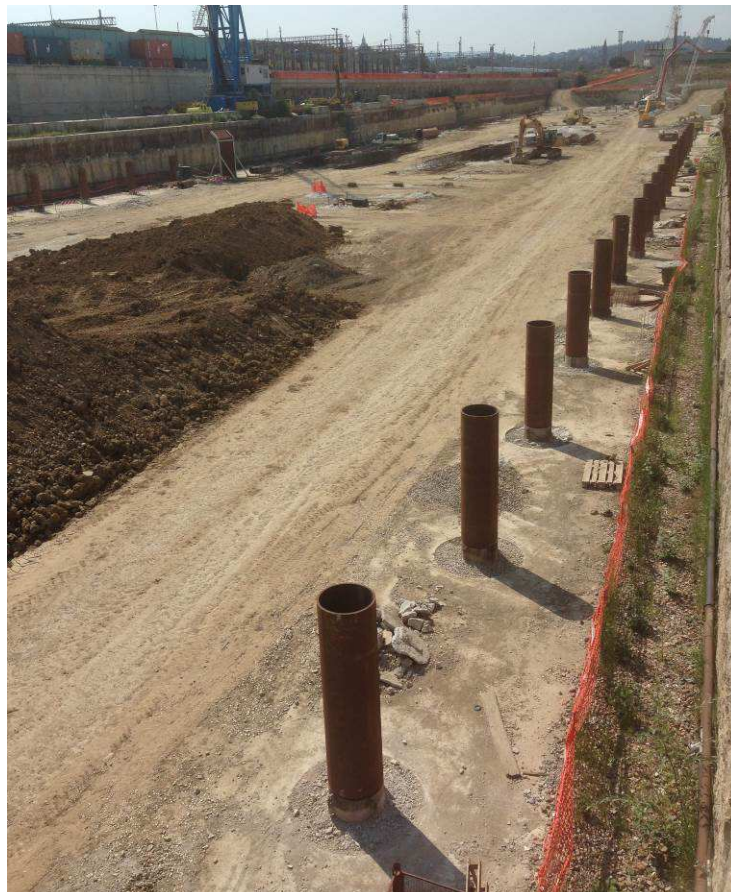


FOTO 3– Prolungamento colonne per Appoggio Solaio Piano Terra

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette

- Completamento soletta pavimentazione viabilità (foto 1);
- Completamento Terminal Bricchette (foto 2);
- Posa armature muri di sostegno Terminal Bricchette (foto 3);



FOTO 1 – Completamento soletta pavimentazione piazzola 8



FOTO 2 – Completamento Terminal Bricchette



FOTO 3 – Completamento Terminal Bricchette

4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

CANTIERE	ZONA	LAVORI DA ESEGUIRE	TIPOLOGIA AUTOR. RICHI.	PERIODO		AUT. GIÀ RICHIESTA	DETERMINA AUTORIZZATA	NECES. EVENT. PROROGHE	NOTE	Elaborati di riferimento
				INIZIO	FINE					
Lotto 2 - ST	Via Circondaria	diaframmi	occupazione suolo pubblico	già attiva		SI	SI	SI	restituzione area a fine lavori	
Lotto 2 - PA	MUGNONE Via Cosseria	imbocco Mugnone	occupazione suolo pubblico	Entro Marzo 2013		NO	NO		durata prevista 12 mesi	
Lotto 2 - PA	MUGNONE Viale Fedi	stacco Mugnone	occupazione suolo pubblico	Entro Marzo 2013		NO	NO		durata prevista 18 mesi	
Lotto 2 - ST	Viale Corsica	via di fuga	passo carrabile	01/09/2011	30/12/2017	SI	SI		restituzione area a fine lavori	Allegato n.1
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi incr. P.le Montelungo	Realizzazione Pozzo di compensation	restringimento corsia			NO			Attività in corso di riprogrammazione - durata prevista 3 mesi	
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi	Realizzazione Pozzo di compensation	chiusura corsia di superficie			NO			Attività in corso di riprogrammazione - durata prevista 3 mesi	
Lotto 2 - PA	Via L. Giordano	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Botticelli	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	SI	SI	SI	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Frà Bartolommeo	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Masaccio	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Frà S. Maruffi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	SI	SI	SI (finita il 29/06/12)	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Giacomini	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via L. da Vinci	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Viale Don Minzoni	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Piazza della Libertà	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	2° semestre 2012	SI	SI (iniziata il 29/06/12 e finita il 14/07/2012)	SI	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Viale S. Lavagnini	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI	SI (iniziata il 16/07/12 e finita il 26/08)	SI	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via C. Landino	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Poliziano	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	ago-12	SI	SI (iniziata il 16/07/12 e finita il 26/08)		durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Bonifazio Lupi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	ago-12	SI	SI (iniziata il 16/07/12 e finita il 26/08)		durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Leone X	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Dionisi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Delle Ghiacciaie	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI	SI (iniziata 01/10/2012 e finita 20/10/2012)	SI (ancora da chiedere)	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Peri	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI	SI (iniziata 01/10/2012 e finita 20/10/2012)	SI (ancora da chiedere)	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Cittadella	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2013	1° semestre 2013	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	

Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica



4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

Ente per rilascio autorizzazione	CANTIERE	TIPOLOGIA AUTOR. RICH.	AUT. GIÀ RICHIESTA	DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE RILASCIATA	PERIODO		NOTE
						INIZIO	FINE	
PROVINCIA DI FIRENZE	CAMPO DI MARTE	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	29/01/2014	31/12/2023	Richiesta implementazione con nota n. 289NV-14 del 26.3.2014
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	29/01/2014	31/12/2023	Richiesta implementazione con nota n. 289NV-14 del 26.3.2014
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	SI	14/12/2011	14/12/2015	
PROVINCIA DI FIRENZE	POZZO NORD	RICHIESTA AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	25/09/2014	SI	31/12/2014	31/12/2015	
AATO 3	POZZO NORD	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	SI	30/08/2012	30/08/2016	
PROVINCIA DI FIRENZE	PASSANTE AV	RICHIESTA AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	25/09/2014	SI	31/12/2014	31/12/2015	
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DILAVANTI	SI	17/07/2011	SI	30/08/2012	30/08/2016	PER AREA CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "A", CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "B", AREA EX CENTRALE DEL LATTE, AREA EX MACELLI, AREA BELFIORE
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	18/07/2011	SI	30/08/2012	30/08/2016	
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DILAVANTI	SI	03/11/2011	SI	17/12/2012	17/12/2016	
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA Nuovi POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	27/03/2015	SI	27/03/2015	27/03/2015	Rilasciata autorizzazione per la realizzazione dei pozzi.
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	14/11/2014	SI	23/01/2015	30/09/2015	In data 13/02/15 il Comune ha fornito il chiarimento, richiesto dal CG in data 28/01/15, sulle prescrizioni riportate nel provvedimento di deroga ai limiti normativi acustici del 23/01/15

4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE
aggiornamento 15/06/2015
ditte
A.T.I.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.
ADRASTEIA S.r.l.
GAVAZZI MAURO S.r.l.
AMDP S.r.l.
TECHNOSOIL S.r.l.
COLABETON S.p.A.
TREVI S.p.A.
CANTINI MARINO s.r.l.
VARVARTITO LAVORI S.r.l.
SOF S.p.A.
OMBA S.p.A.
VISCOVO SALDATURE S.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE
aggiornamento 15/06/2015
ditte
A.T.I.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.
AMDP S.r.l.
SOF S.p.A.
ELETTRI-FER S.r.l.
CALCESTRUZZI VALDARNO S.r.l.
EUROBUILDING S.r.l.
