

REPORT QUINDICINALE N. 149

Periodo di riferimento: 1 Giugno 2017 - 15 Giugno 2017



INDICE REPORT

1. DATI GENERALI	3
2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE	4
3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE.....	5
3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno.....	5
3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato	6
4. SEZIONE CANTIERI	7
4.1. Elenco cantieri fissi	7
4.1.1. CANTIERE STAZIONE	8
4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE	9
4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO	10
4.1.4. CANTIERE FORTEZZA	11
4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE.....	12
4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'	17
4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI	22
4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE	23
4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI	24

1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA VELOCITA' DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell'Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.


ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall'Associazione Temporanea di Imprese COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE	10/03/2010
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE	13/10/2010
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale):	27/08/2015*
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):	15/11/2016*

**) istruttoria di proroga in corso*

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

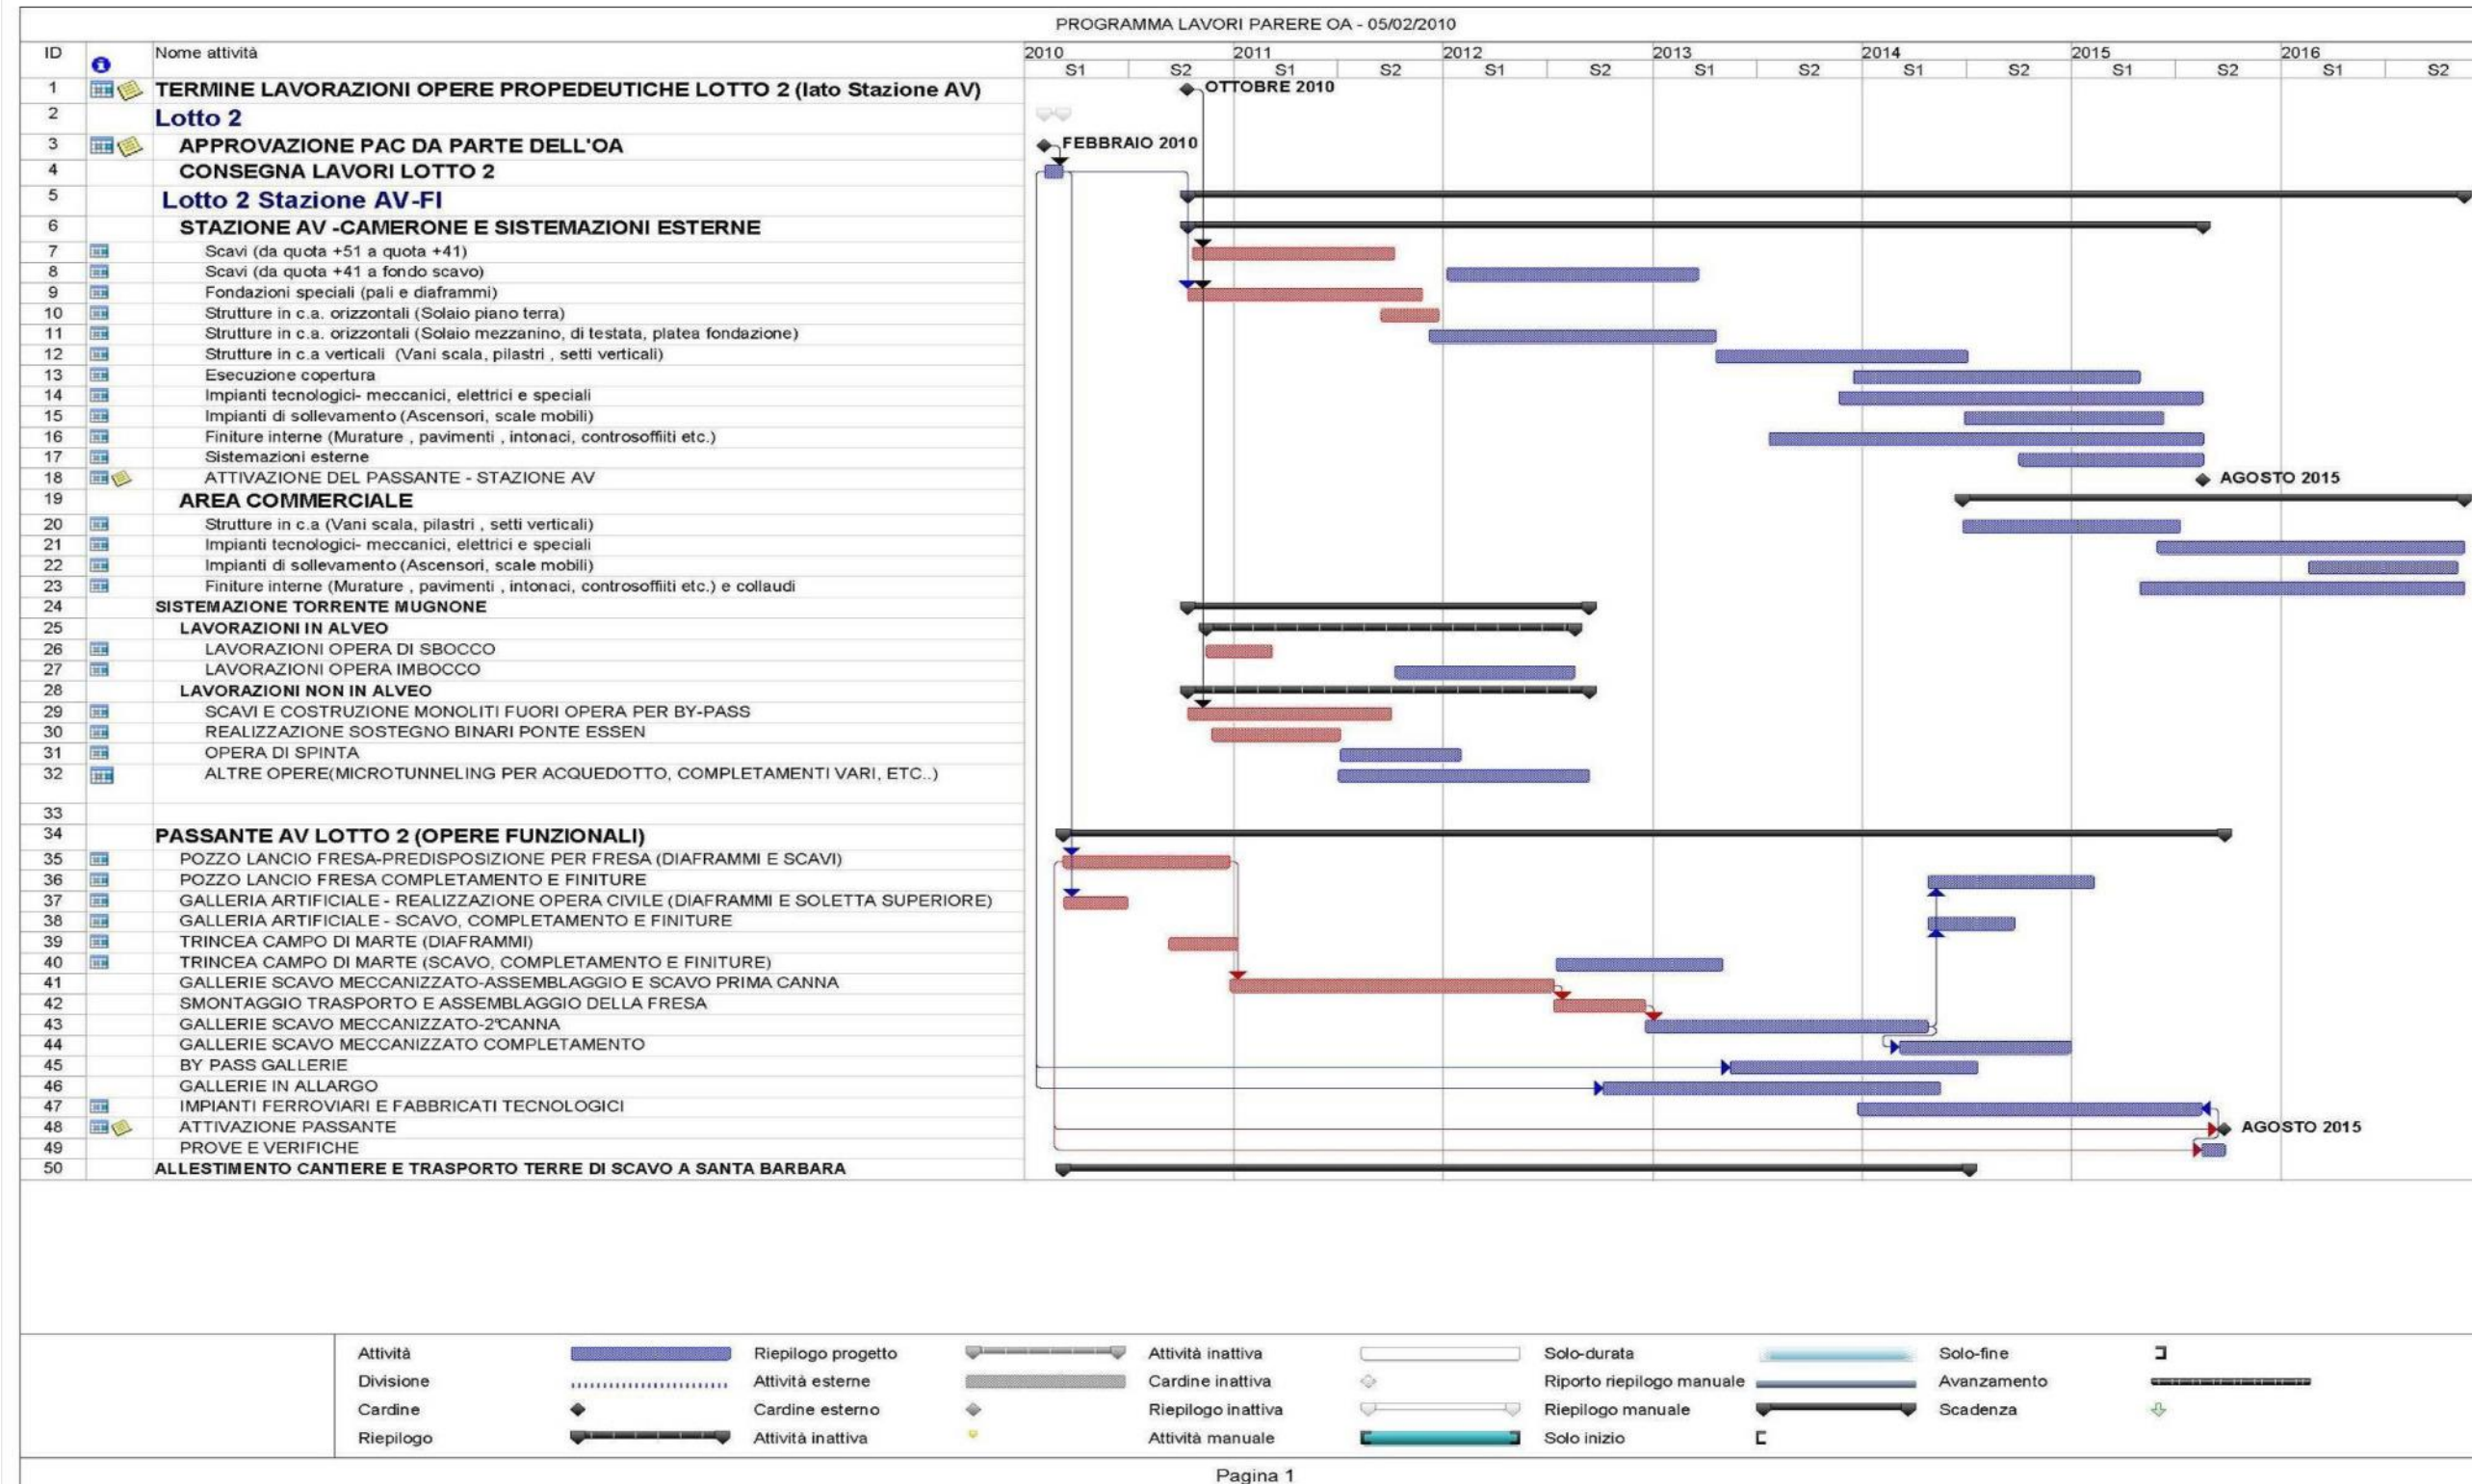

3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 REPORT QUINDICINALE N. 149 Periodo di riferimento 01/06/2017 - 15/06/2017				2017											
ID	Nome attività	% Avanzamento progressivo	Durata	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	Lotto 2		4772 g												
6	STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE		4024 g												
8	Scavi (da quota +41 a fondo scavo) (*)	0%	815 g												
10	Pozzo costruttivo Nord (diaframmi, consolidamenti e scavo)	75%	149 g												
12	Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)	85%	479 g												
13	Strutture in c.a. orizzontali (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)	0%	500 g												
34	PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)		4326 g												
42	GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AVVIO SCAVO PRIMA CANNA (*)	0%	407 g												
43	Cantierizzazione e realizzazione trincee per Compensation Grouting Fortezza da Basso	0%	300 g												

(*) ATTIVITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE

3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato

4. SEZIONE CANTIERI

4.1.

Elenco cantieri fissi

- **CANTIERE STAZIONE**
- **BY PASS MUGNONE**
- **CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO**
- **AREA FORTEZZA**

4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.1.1

REPORT QUINDICINALE N. 149

Periodo di riferimento: 01 Giu 2017 - 15 Giu 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - GIUGNO 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
SCAVI (da quota +51 a quota +41)	21/11/2011	25/04/2015	1251	100%														Attività ripianificata a seguito di richieste Arpat
SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)	15/05/2017	07/08/2019	815	0%														
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi)	13/10/2010	09/06/2015	1701	100%														
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano terra)	16/07/2015	31/03/2017	625	85%														
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)																		
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala, pilastri, setti verticali)																		
ESECUZIONE COPERTURA																		
IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI																		
FINITURE INTERNE (Murature, pavimenti, intonaci, controsoffitti etc.)																		
POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi, consolidamenti e scavo)	09/08/2010	31/08/2017	2580	75%														

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

CANTIERE BY PASS MUGNONE

SEZ. 4.1.2

REPORT QUINDICINALE N. 149

Periodo di riferimento: 01 Giu 2017 – 15 Giu 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - GIUGNO 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
<u>LAVORAZIONI IN ALVEO</u>																		Attività in corso di definizione
LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO																		Lavorazione Stralciata - sarà eseguita direttamente dall'Amministrazione Comunale
LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO																		Attività in corso di definizione
<u>LAVORAZIONI NON IN ALVEO</u>																		Attività in corso di definizione
SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS																		Attività in corso di definizione
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN																		Attività in corso di definizione
OPERA DI SPINTA																		Attività in corso di definizione
ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)																		Attività in corso di definizione

 ATTIVITA' REALIZZATA

 ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO

SEZ. 4.1.3

REPORT QUINDICINALE N. 149

Periodo di riferimento: 01 Giu 2017 - 15 Giu 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - GIUGNO 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
ASSEMBLAGGIO FRESA	31/08/2015	25/10/2015	55	100%														
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON ATTRAVERSAMENTO A PIENO)	02/05/2017	18/11/2017	200															Attività in corso di definizione
MANUTENZIONE FRESA																		
SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE																		
SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)																		
MANUTENZIONE FRESA																		
ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE																		
SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA																		

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA

SEZ. 4.1.4

REPORT QUINDICINALE N. 149

Periodo di riferimento: 01 Giu 2017 – 15 Giu 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - GIUGNO 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE RASTRIGLIA - FASE A	05/02/2017	28/03/2017	51															
CANTIERI AREE N.3-4	25/03/2017	22/04/2017	29															
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (TAM)	20/04/2017	15/07/2017	87															
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI	15/05/2017	25/07/2017	72															
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI	26/07/2017	27/08/2017	33															
CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE CAVANIGLIA - FASE A	05/02/2017	28/03/2017	51															
CANTIERI AREE N.1-2	22/02/2017	13/04/2017	51															
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE	20/03/2017	17/05/2017	59															
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI	10/05/2017	29/06/2017	51															
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI	30/06/2017	28/07/2017	29															

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

- Sotto il Solaio Fili 3-5 ed il ventaglio 9, sono in corso gli interventi di ripristino delle travi per la presentazione del faccia vista e per la risoluzione delle Non Conformità (Foto 1);
- Sul Ventaglio Asse 33 è in corso la casseratura delle travi T5 lato Est ed Ovest, ed è stata gettata la trave T4 lato Est (Foto 2);
- Sulla Testata Sud è stato completato il banchinaggio e prosegue la posa dell'armatura del Solaio livello 00 (Foto 3);



Foto 1 – Ripristino delle travi per la presentazione del faccia vista, ventaglio 9



Foto 2 – Getto Trave T4 lato Est e cassera Trave T5 lato Ovest, Ventaglio Asse 33



Foto 3 – Banchinaggio e Montaggio armatura Solaio liv. 00 Testata Sud - lato Est



Foto 4 – Panoramica da Sud

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette

- A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;
- Allo Scavalco proseguono le attività per la risoluzione delle NC184 e 185;
- A Campo di Marte è stata completata la fondazione delle barriere antirumore per la schermatura del nastro ed è in corso in montaggio delle barriere (Foto 1 e 2).



Foto 1 – Montaggio barriere antirumore per schermatura nastro – Area Campo di Marte



Foto 2 – Montaggio barriere antirumore per schermatura nastro – Area Campo di Marte

4.3.

LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

CANTIERE	ZONA	LAVORI DA ESEGUIRE	TIPOLOGIA AUTOR. RICH.	PERIODO		AUT. GIA' RICHIESTA	DETERMINA AUTORIZZATA	NECES. EVENT. PROROGHE	NOTE	Elaborati di riferimento
				INIZIO	FINE					
Lotto 2 - ST	Via Circondaria	diaframmi	occupazione suolo pubblico	già attiva	-	SI	SI	SI	restituzione area a fine lavori	
Lotto 2 - PA	MUGNONE Via Cosseria	imbocco Mugnone	occupazione suolo pubblico			NO	NO		durata prevista 12 mesi	
Lotto 2 - PA	MUGNONE Viale Redi	sbocco Mugnone	occupazione suolo pubblico			NO	NO		durata prevista 18 mesi	
Lotto 2 - ST	Viale Corsica	via di fuga	passo carrabile	01/09/2011	30/12/2017	SI	SI		restituzione area a fine lavori	Allegato n.1
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi - Giardini Fortezza da Basso	Realizzazione Trincea 1 per compensation grouting	occupazione / alterazione suolo pubblico e richiesta di ordinanza alla mobilità	gen-17	set-17	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi - Fossato Fortezza da Basso	Realizzazione Trincea 2 per compensation grouting	occupazione ed alterazione suolo pubblico	lug-17	mag-18	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi	Realizzazione Trincea 3 per compensation grouting	occupazione ed alterazione suolo pubblico	lug-17	feb-18	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi - Parcheggio Binario 16	Realizzazione Trincea 4 per compensation grouting	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	ott-17	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi - Parcheggio Binario 16	Spostamento varco in uscita dal parcheggio - piazzale Montelungo	occupazione /alterazione suolo pubblico e richiesta di ordinanza alla mobilità	gen-17	feb-17	SI	NO		Durata Lavoro prevista 1 mese	
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi	BOE in viale Strozzi e Polifora tra la Trincea 3 e 4	occupazione /alterazione suolo pubblico e richiesta di ordinanza alla mobilità	lug-17	set-17	SI	NO		Durata Lavoro prevista 43 gg con modifica all'assetto viario	
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi - Fossato Fortezza da Basso	Polifora tra la Trincea 1 e 2	occupazione /alterazione suolo pubblico	lug-17	mar-18	SI	NO		Attività eseguita da Tramvia	
Lotto 2 - PA	via Reginaldo Ciulinari 159	Demolizione fabbricato	prima richiesta occupazione suolo pubblico per cantiere per gg. 48	dic-16	dic-16	SI	SI (Provvedimento Dirigenziale n° 2016/M09485 e MOB1-3379-2016)		L'attività è stata realizzata di notte	
Lotto 2 - PA	via Reginaldo Ciulinari 159	Demolizione fabbricato	Proroga del Provvedimento Dirigenziale n° 2016/M08485 e MOB1-3379-2016 occup. suolo pub. e passo carr. provv.	gen-17	apr-17	SI	SI		proroghe fino alla data 16.04.2017	
Lotto 2 - PA	via Frà Bartolomeo	Sondaggio SP2	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Piazza della Libertà	Sondaggio SD3	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Viale S. Lavagnini	Sondaggio SP4	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Fortezza da Basso	Sondaggio SD5	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE	
Lotto 2 - PA	Via Delle Chiacciate	Sondaggio SP6	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	viale Corsica	Sondaggio SD9	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	via del Terzolle	Sondaggio SP10	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE	
Lotto 2 - PA	via Frà Bartolomeo	Integrazione Proroga Sondaggio SP2	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	Piazza della Libertà	Proroga Sondaggio SD3	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

CANTIERE	ZONA	LAVORI DA ESEGUIRE	TIPOLOGIA AUTOR. RICH.	PERIODO		AUT. GIÀ RICHIESTA	DETERMINA AUTORIZZATA	NECES. EVENT. PROROGHE	NOTE	Elaborati di riferimento
				INIZIO	FINE					
Lotto 2- PA	Viale S. Lavagnini	Proroga Sondaggio SP4	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2- PA	Fortezza da Basso	Proroga Sondaggio SD5	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2- PA	Via Delle Ghiacciaie	Proroga Sondaggio SP6	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2- PA	viale Corsica	Proroga Sondaggio SD9	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2- PA	via del Terzolle	Proroga Sondaggio SP10	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2- PA	via Frà Bartolomeo	Integrazione Proroga Sondaggio SP2	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Piazza della Libertà	Integrazione Proroga Sondaggio SD3	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Viale S. Lavagnini	Integrazione Proroga Sondaggio SP4	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Fortezza da Basso	Integrazione Proroga Sondaggio SD5	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Via Delle Ghiacciaie	Integrazione Proroga Sondaggio SP6	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	viale Corsica	Integrazione Proroga Sondaggio SD9	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	via del Terzolle	Integrazione Proroga Sondaggio SP10	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	via Frà Bartolomeo	Proroga dell'Integrazione Sondaggio SP2	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Piazza della Libertà	Proroga dell'Integrazione Sondaggio SD3	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Viale S. Lavagnini	Proroga dell'Integrazione Sondaggio SP4	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Fortezza da Basso	proroga dell'Integrazione Sondaggio SD5	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	viale Corsica	proroga dell'Integrazione Sondaggio SD9	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	via del Terzolle	proroga dell'Integrazione Sondaggio SP10	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	SI		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

CANTIERE	ZONA	LAVORI DA ESEGUIRE	TIPOLOGIA AUTORIZZATA	PERIODO		AUT. GIÀ RICHIESTA	DETERMINAZIONE AUTORIZZATA	NECESSARI EVENTI PROROGHE	NOTE	Elaborati di riferimento
				INIZIO	FINE					
Lotto 2- PA	via Frà Bartolomeo	Seconda Proroga dell'Integrazione Sondaggio SP2	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	NO		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Piazza della Libertà	Seconda Proroga dell'Integrazione Sondaggio SD3	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	NO		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Viale S. Lavagnini	Seconda Proroga dell'Integrazione Sondaggio SP4	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	NO		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	Fortezza da Basso	Seconda proroga dell'Integrazione Sondaggio SD5	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	NO		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	viale Corsica	Seconda proroga dell'Integrazione Sondaggio SD9	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	NO		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	via del Terzolle	Seconda proroga dell'Integrazione Sondaggio SP10	occupazione ed alterazione suolo pubblico	mag-17	giu-17	SI	NO		per le necessarie analisi ulteriori 2 fori	
Lotto 2- PA	da Campo di Marte a Piazza della Libertà	Capisaldi per monitoraggio	Occupazione permanente di suolo pubblico	mar-17	mar-17	SI	SI	NO	parere acquisito	
Lotto 2- PA	da Campo di Marte a Piazza della Libertà	Capisaldi per monitoraggio	richieste di Alterazione Suolo Pubblico	lug-17	ago-17	SI	NO			

Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica



4.4.

ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

Ente per rilascio autorizzazione	CANTIERE	TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE	AUT. GIÀ RICHIESTA	DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE RILASCIATA	PERIODO		NOTE
						INIZIO	FINE	
PROVINCIA DI FIRENZE	CAMPO DI MARTA	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTA DALL'OA IL 5/2/2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	S	29/01/2014	31/12/2023	Richiesta implementazione con nota n. 288NV/14 del 28/3/2014
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTA DALL'OA IL 5/2/2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	S	29/01/2014	31/12/2023	Richiesta implementazione con nota n. 288NV/14 del 28/3/2014
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	S	20/12/2015	20/12/2019	
REGIONE TOSCANA Genio Civile	POZZO NORD	RICHIESTA AGGIORNAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	17/11/2015	S	01/01/2016	31/12/2016	richiesta di rinnovo del 07/06/2016 nota NV2487NV/16
AATO 3	POZZO NORD	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	S	30/08/2012	30/08/2016	
REGIONE TOSCANA Genio Civile	PASSANTE AV	RICHIESTA AGGIORNAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	17/11/2015	S	01/01/2016	31/12/2016	richiesta di rinnovo del 07/06/2016 nota NV2487NV/16
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DILAVANT	SI	17/07/2011	S	30/08/2012	30/08/2016	PER AREA CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "A", CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "B", AREA EX CENTRALE DEL LATTE, AREA EX MACELL, AREA BELFIORE
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	18/07/2011	S	30/08/2012	30/08/2016	
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DILAVANT	SI	03/11/2011	S	17/12/2012	17/12/2016	
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTA DALL'OA PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	27/03/2015	S	27/03/2015	27/03/2016	
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	16/11/2016	S	25/11/2016	28/02/2017	proroga 2016/DD/06963
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	20/01/2017	S	01/03/2017	31/12/2017	Provvedimenti Dirigenziali 2017/DD/01203 e 2017/DD/01341
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	AUT PERFORAZIONE POZZO M4	SI	05/05/2016	S	05/05/2016	05/11/2016	Autorizzazione alla perforazione N. 25/4 del 05/05/2016
REGIONE TOSCANA	PASSANTE AV	AUT PERFORAZIONE POZZO OPD FORTEZZA DA BASSO	SI	11/02/2016	S	08/06/2016	05/12/2016	Decreto dirigenziale 12505
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	02/03/2016	S	22/07/2016	31/12/2016	Provvedimento Dirigenziale 2016/DD/06261
COMUNE DI FIRENZE	PASSANTE AV - Cantiere Fresa Campo di Marte	RICHIESTA DI DEROGA AL RUMORE	SI	16/03/2016	S	15/05/2017	31/12/2020	Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/02699 del 13/04/2017
COMUNE DI FIRENZE	PASSANTE AV - Fortezza da Basso	DEROGA AL RUMORE	SI	22/07/2016	S	26/08/2016	22/08/2017	Provvedimento Dirigenziale 2016/DD/05908 del 12/04/2017
COMUNE DI FIRENZE	PASSANTE AV - Fortezza da Basso	RICHIESTA DI PROROGA PER DEROGA AL RUMORE	SI	22/03/2016	S	22/08/2017	31/08/2018	Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/02653
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Domanda di Concessione per aumento portata di falda MV1-MV2-MV3	SI	21/07/2016	S	10/05/2017	31/12/2027	Numero della concessione 6202 - 6042 - 6043 del 10/05/2017
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	POZZO M4 RICHIESTA DI AUMENTO PORTATA DI FALDA	SI	30/11/2016	NO			Domande di Concessione e aumento di portata prot 5845NV/16 del 30/11/2016 e prot 6283 NV/17 del 20/01/2017
REGIONE TOSCANA	PASSANTE AV	Domanda di Concessione per aumento portata di falda WW2-WW3	SI	21/07/2016	NO			In seguito a riunione con il G.C. del 22/11/2016, è stata concessa nuova licenza con nota 5522NV/15 del 24/11/2016
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Concessione di acque pubbliche pozzo MV5	SI	21/07/2016	S	17/02/2017	31/12/2016	Pratica 3985
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Concessione di acque pubbliche pozzo MV6	SI	21/07/2016	S	17/02/2017	31/12/2016	Pratica 3086
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Concessione di acque pubbliche pozzo MV7	SI	21/07/2016	S	17/02/2017	31/12/2016	Pratica 3987
SUAP Firenze	STAZIONE AV - PASSANTE AV	Richiesta di proroga per scarichi Campo di Marte e Stazione (meteoriche ed industriali) AUT. 166, 169, 170, 171, 172, 200, 177 e 306	SI	09/09/2015 prot. 2447NV/15 richiesta di rinnovo alle aut. in scadenza.	solo rinnovo ex AUT. 177, per le altre ci avvaliamo della proroga trasmessa con nota 3794NV/16 del 23/09/2016	aut. P.G. 48638 del 25/12/2015	al 20/12/2019	Rinnovo autorizzazione ex art. 177 con nuove aut. Comune di Firenze P.G. 48638 del 17/02/2017. Per le altre autorizzazioni è stata iscritta SUAP del Comune di Firenze 3368NV/16 del 27/07/2016 e 3798NV/16 del 20/09/2016.
SUAP Cavriglia	Santa Barbara	scarico acque reflue su corpo idrico superficiale (ARI), colline schermo e cantiere logistico).	SI	09/09/2016 domanda di rinnovo al SUAP Comune di Cavriglia (AR)	S	31/08/2013	31/08/2017	Richiesta di proroga alla trascrizione della documentazione integrativa in seguito agli atti relativi su Piano di Utilizzo Terre
SUAP Firenze	Stazione	Richiesta AJA per rinnovo scarichi AMD su torrente Mugrone	SI	09/09/2016	NO	17/04/2013	17/04/2017	Rinnovo aut. 1427. Nostra nota prot. n. 3705NV/16
Regione Toscana Genio Civile Arezzo	Santa Barbara	Richiesta attingimento acque superficiali	SI	12/09/2016	S	29/09/2016	31/12/2016	da richiedere nuova autorizzazione per il 2017
Regione Toscana Genio Civile Arezzo	Santa Barbara	Richiesta attingimento acque superficiali	SI	27/01/2017	NO	01/01/2017	31/12/2017	Nella Regione Toscana ricevuta in data 09/06/2017 con richiesta accolta previo pagamento canoni di concessione
Regione Toscana Genio Civile Firenze	Ex Scovazzo	Richiesta aggettamento acque superficiali finalizzata all'abbassamento del livello di falda	SI	10/10/2016	S	03/03/2017	31/12/2017	Pratica n. 1509
SUAP Firenze	Passante AV	Richiesta AJA per rinnovo modifica sostanziale scarichi AMD ed industriali aut. P.G. 48638 del 17/02/2016	SI	07/11/2016	NO			Richiesta di modifica presentata in data 07/11/2016 con nota 5106NV/16

4.5.

**PRESCRIZIONI
OSSERVATORIO
AMBIENTALE**

4.6.

**ELENCO DITTE
SUBAPPALTATRICI**

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/06/2017

ditte

AMDP S.r.l.

CAF S.c.r.l.

COLABETON S.p.A.

GAVAZZI MAURO S.r.l.

GIGLIO Servizi Ambientali e Bonifiche S.r.l.

ME.MO.FER. S.r.l.

NODAVIA S.c.p.A.

PIZZI TERRA S.r.l.

SOF S.p.A.

TECNOLAB S.r.l.

SISTRAL S.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/06/2017

ditte

ERGON S.c. a r.l.

BOSCO ITALIA S.r.l.

MOSCONI S.r.l.

NODAVIA S.c.p.A.

PIZZI TERRA S.r.l.

DURAZZANI S.r.l.

SOF S.p.A.

MATEC S.r.l.

GREEN SERVICE S.r.l.
