FASI GIA' ESEGUITE

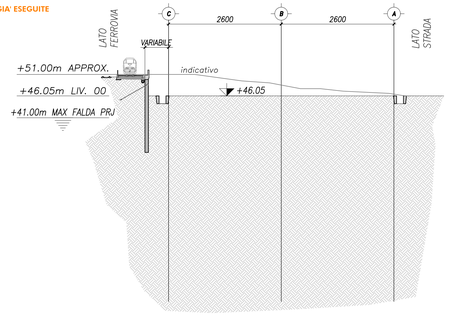

FASE 1: SCAVO DI SBANCAMENTO
FINO A QUOTA +45.05m E
REALIZZAZIONE CORDOLI GUIDA

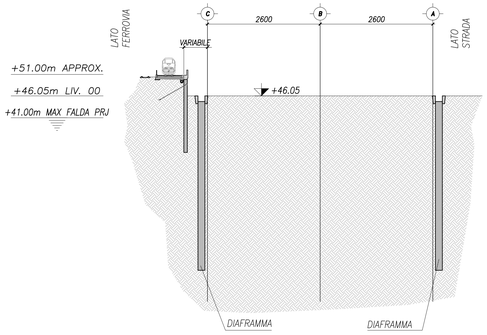

FASE 2: ESECUZIONE DIAFRAMMI CAMERONE

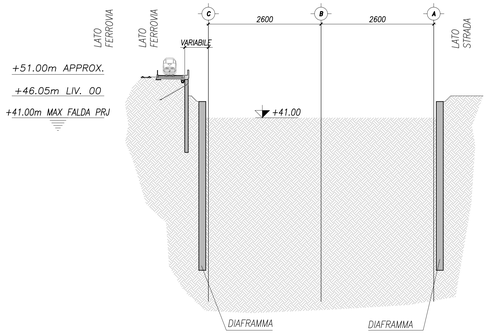

FASE 3: SCAVO A QUOTA +41.00m

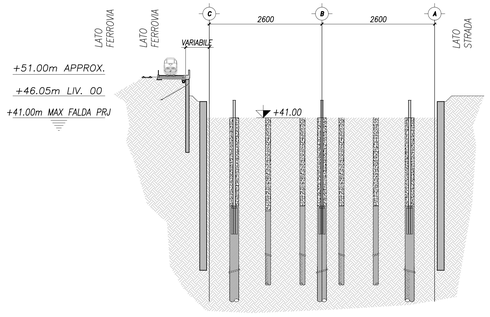

FASE 4: ESECUZIONE PALI DI FONDAZIONE E STRUTTURA
VERTICALE PROVVISORIA

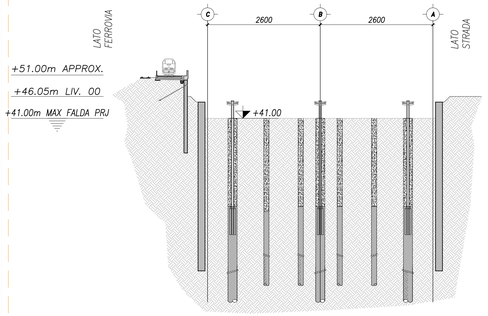

FASE 5: p.m
FASE 6: MONTAGGIO CAPITELLI LIV.0

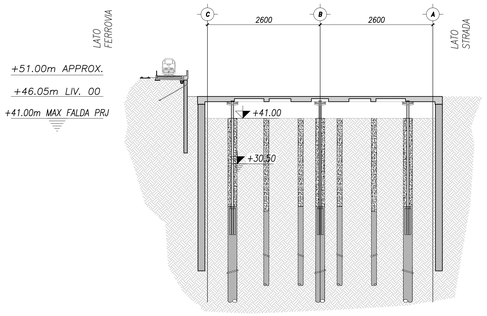

FASE 7: POSA IN OPERA SOLAIO PIANO TERRA E
TRAVI DI CORREA DEI DIAFRAMMI
FASE 8: AGGOTTAMENTO FALDA A QUOTA +30.50m

FASI DA ESEGUIRE
(CONFIGURAZIONE INIZIALE DI PROGETTO)**

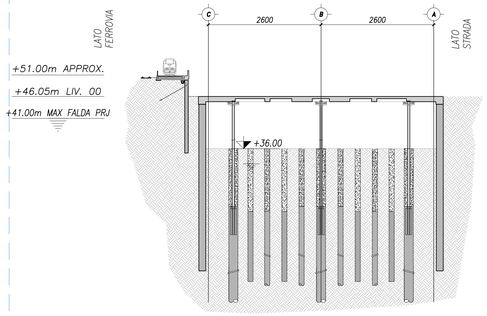

FASE 9: SCAVO A QUOTA +36.00m
REALIZZAZIONE PALI INTEGRATIVI

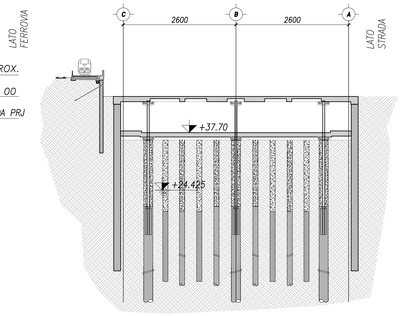

FASE 10: MONTAGGIO CAPITELLI E POSA IN OPERA
SOLAIO M2 A QUOTA +37.70m
FASE 11: AGGOTTAMENTO FALDA A QUOTA +24.425m

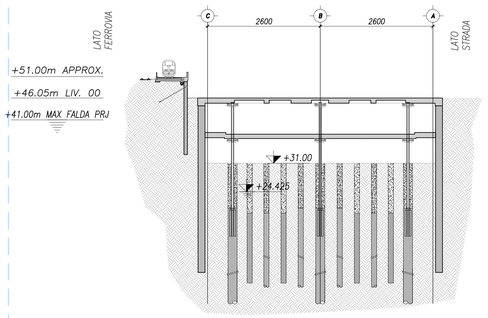

FASE 12: SCAVO A QUOTA +31.000

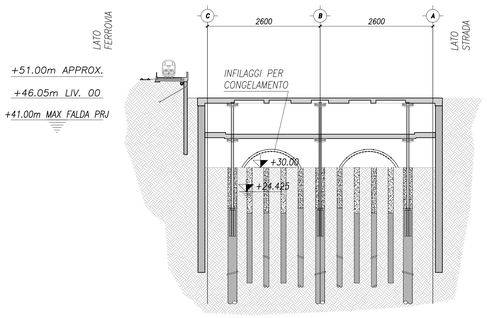

FASE 13: SCAVO A QUOTA +30.000,
FASE 14: ESECUZIONE INFILAGGI SUPERIORI PER CONGELAMENTO TERRENO

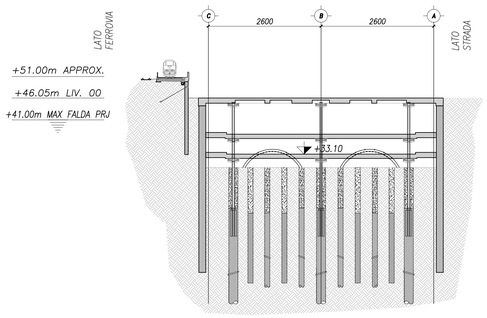

FASE 15: MONTAGGIO CAPITELLI E POSA IN OPERA SOLAIO M0 A QUOTA
+33.10m (ECCETTO ZONA PROSSIMA AGLI INFILAGGI)

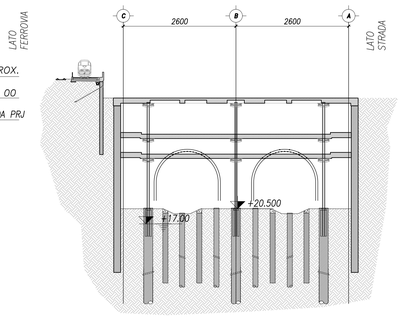

FASE 16: SCAVO FINO A QUOTA +24.925
FASE 17: AGGOTTAMENTO FALDA A QUOTA +17.00m
FASE 17': SCAVO FINO A QUOTA +20.50/19.35

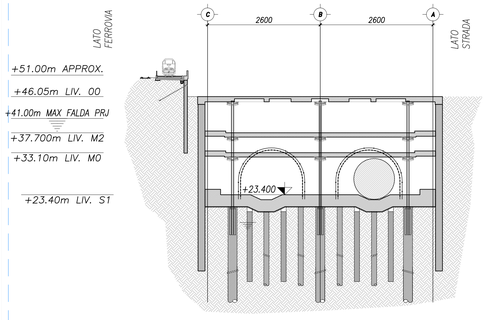

FASE 19: ESECUZIONE PLATEA DI FONDAZIONE
E ATTRAVERSAMENTO A VUOTO CAMERONE LATO OVEST CON TBM

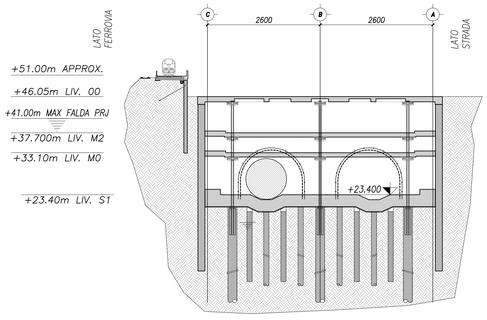

FASE 20: ESECUZIONE INFILAGGI INFERIORI PER CONGELAMENTO TERRENO
FASE 21: ATTRAVERSAMENTO A VUOTO CAMERONE LATO EST CON TBM

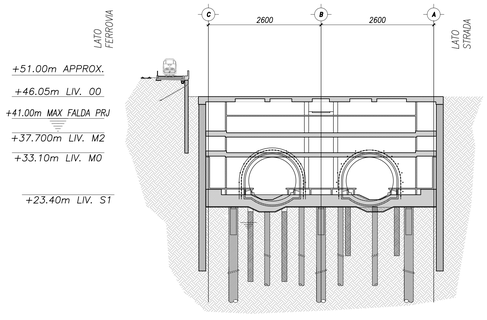

FASE 22: ESECUZIONE STRUTTURE PORTANTI IN C.A.
(PILASTRI, VANI SCALA E ASCENSORI)
FASE 23: COSTRUZIONE TRAVI PARAPETTO LIVELLI M0 E
M2; DEMOLIZIONE COLONNE PROVVISORIE IN ACCIAIO

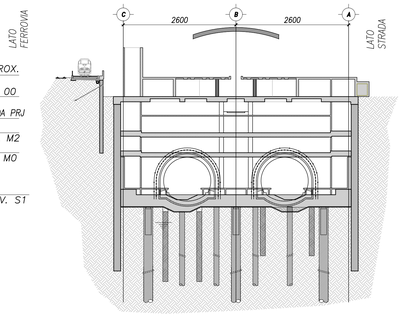

FASE 24: COSTRUZIONE SOLAI LIVELLI M3 E 01, COMPLETAMENTO ALTRI SOLAI
CON CHIUSURA ASOLE PROVVISORIE, COSTRUZIONE STRUTTURE VERTICALI MINORI
FASE 25: MONTAGGIO COPERTURA

NOTE GENERALI

- QUOTE ALTIMETRICHE ASSOLUTE, ESPRESSE IN METRI E CONFORMI AL PROGETTO ARCHITETTONICO
- DIMENSIONI ESPRESSE IN MILLIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI CORRELATI ED ALLE RELATIVE SPECIFICHE
- PER ELEMENTI IN CALCESTRUZZO A VISTA FARE RIFERIMENTO ANCHE AI DISEGNI ARCHITETTONICI
- PER LE STRUTTURE A VISTA FARE RIFERIMENTO ANCHE AI DISEGNI ARCHITETTONICI
- LE OPERE PREVISTE DALLA FASE 1 ALLA 9 SONO GIA' STATE REALIZZATE (ESCLUSA LA REALIZZAZIONE DEI PALI INTEGRATIVI).

** IN MERITO ALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE DI PROGETTO (FASE 9), SI RIMANDA ALL' ELABORATO NF1W.00.E.ZZ.P9.FV0000.010



COMMITTENTE

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE

IFR FIRENZE
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA MILANO – NAPOLI
NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA AV

STAZIONE AV
FV00A - DIAFRAMMI

Camerone
Fasi esecutive degli scavi: testata

SCALA 1:500

IL PROGETTISTA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
dott. ing. ROSARIO SORBELLO
Iscritto al n. 3561 dell'Albo A. degli Ingegneri

Inforail Firenze srl - IFR Firenze
sede legale: Via Circondario, 32-34 – 50127 – Firenze
PEC: infrorail.pec@legalmail.it
Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese: 06956550484

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO	DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NF1W	00	E	ZZ	W8	FV00A0	006	C

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
A	Emissione	F. Durastanti	15/12/2020	N. Granieri	15/12/2020	R. Sorbello	17/12/2020
B	Revisione	R. Frecentese	28/02/2022	R. Sorbello	28/02/2022	R. Sorbello	28/02/2022
C	REVISIONE	SIRIANNI	21/06/2022	FRECENTESE	21/06/2022	SORBELLO	23/06/2022

File: NF1W.00.E.ZZ.W8.FV00A0.006.C | n. Elab.:
